

PANEL DEL EQUIPO

Decisiones claras, Sprint a Sprint.

Registrá el cierre, adjuntá evidencia y seguí la evolución sin planillas ni cuentas manuales.

ÚLTIMA VELOCIDAD

37

puntos aceptados

PROMEDIO

34

puntos por Sprint

CUMPLIMIENTO

100%

del compromiso

SPRINT GOAL

Cumplido

Sprint 5

02

Evolución

Los gráficos se actualizan al guardar.

Ver Sprint

Sprint 2

Burndown

Sprint 2

Ideal

Real

Etapa	Ideal	Real
Inicio del sprint	24	24
Semana 1	14	14
Semana 2	10	10
Cierre del sprir	0	0

Capacidad por integrante

Sprint 2

Estimada


Real

Integrante	Estimada	Real
Alves Rodrigo	24	8
Martinez Mateo	24	8
Rojas Pessuto Tobías	24	8
Pineda Álvaro	24	8

Velocidad

Tendencia de puntos aceptados


Aceptados

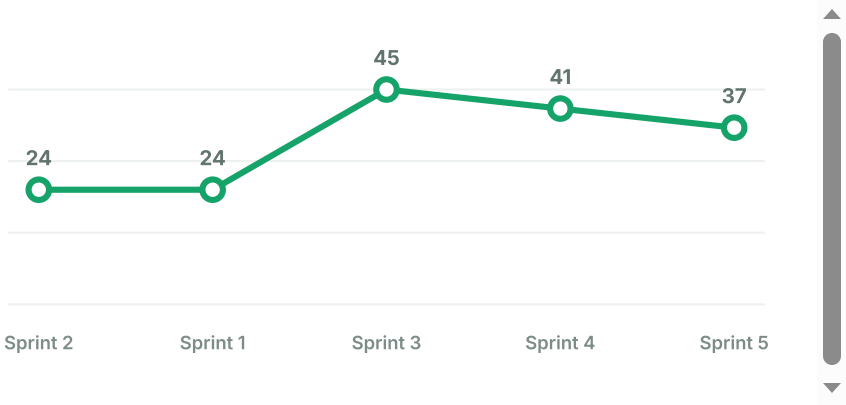

Compromiso

Puntos comprometidos vs. aceptados


Comprometidos Aceptados

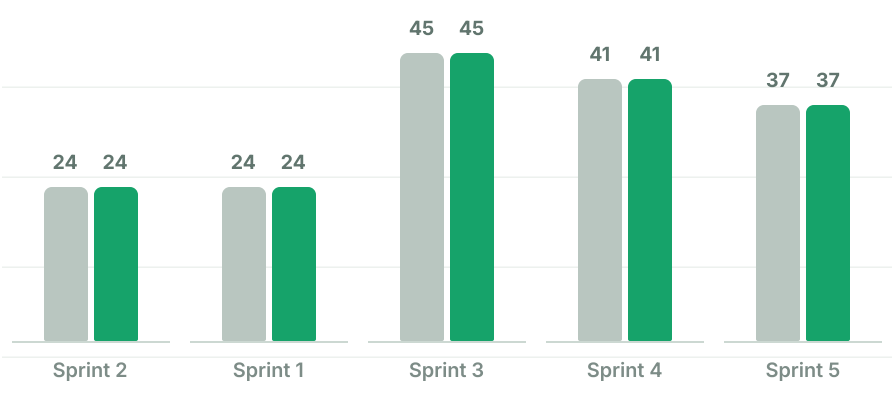

Historias de usuario

HU comprometidas vs. completadas


Comprometidas Completadas

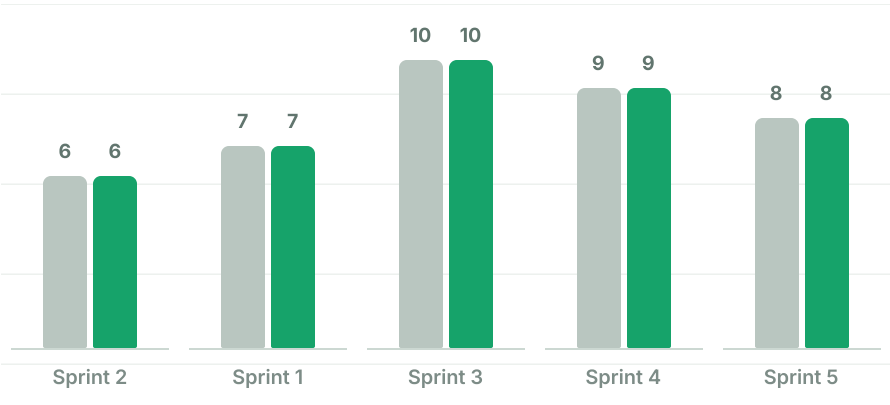

Capacidad

Horas estimadas vs. reales

Estimada Real

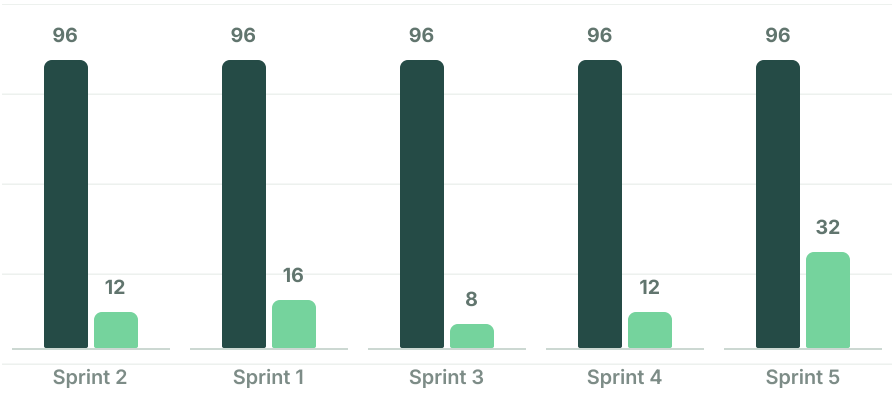

Estado de pruebas


Sprint 2



- Superadas 4 100%
- Fallidas 0 0%
- Pendientes 0 0%

Defectos e incidencias

Clasificación por Sprint

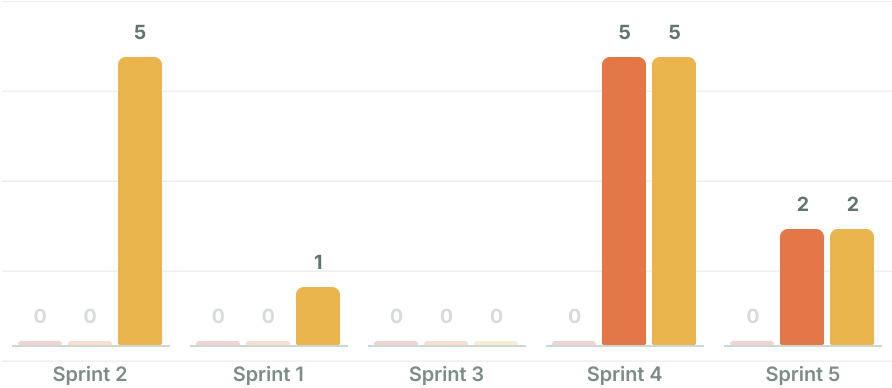

03

Registro de Sprints

Números, observaciones y evidencia en un solo lugar.

SPRINT	GOAL	PUNTOS	HU	CAPACIDAD	DEFECTOS	PRUEBAS	IMPED.	INCREMENTO / OBSERVACIONES
Sprint 2 3 sem.	Cumplido	24/24	6/6	12/96 h	0 críticos 0 otros 5 incid. Sin evidencia	4 ✓ 0 ✕ 0 pend.	0 No se registraron impedimentos bloqueantes durante el Sprint 2. Se observaron pequeñas demoras asociadas a configuración del entorno blockchain, despliegue en Sepolia, ajustes de Docker Compose y validaciones de CI, pero fueron resueltas dentro del sprint y no afectaron el cumplimiento del Sprint Goal.	Contrato ECOToken ampliado con mint con trazabilidad de material y peso, pausa/despasa mediante ADMIN_ROLE, emergencyBurn mediante EMERGENCY_ROLE, suite de tests unitarios y fuzzing en Foundry, validación de cobertura mínima en CI, despliegue y verificación en Sepolia, y Docker Compose para levantar PostgreSQL, backend y frontend en entorno local. El Sprint 2 permitió consolidar la capa blockchain del proyecto y preparar la base para la integración backend-blockchain del Sprint 3. No

sprint	goal	puntos	hu	capacidad	defectos	pruebas	imped.	incremento / observaciones
								se registró formalmente la capacidad real por integrante, por lo que se mantiene como acción de mejora para el próximo sprint. Se recomienda seguir adjuntando evidencias técnicas de tests, CI, deploy y Docker Compose.
Sprint 1 3 sem.	Cumplido	24/24	7/7	16/96 h	0 críticos 0 otros 1 incid. Sin evidencia	0 ✓ 0 ✗ 0 pend. Sin evidencia	0 Sin detalle	Base técnica verificable para la construcción del MVP - registrar mayor precisión la velocidad real del equipo - documentar mejor los detalles de pruebas - mantener actualizado el readme
Sprint 3 3 sem.	Cumplido	45/45	10/10	8/96 h	0 críticos 0 otros 0 incid. Sin evidencia	13 ✓ 0 ✗ 1 pend. Sin evidencia	0 No hubo bloques en este sprint	Base funcional del MVP ampliada con los primeros flujos de registro, validación y navegación del sistema, incluyendo registro de empresas, aceptación de términos, generación de billetera custodial, aprobación administrativa, alta/login de cooperativas, búsqueda de empresas aprobadas, landing pública, estructura frontend por roles y preparación técnica del contrato ECOToken mediante patrón UUPS. Sin observaciones
Sprint 4 3 sem.	Cumplido	41/41	9/9	12/96 h	0 críticos 5 otros 5 incid. Sin evidencia	21 ✓ 0 ✗ 1 pend. Sin evidencia	0 No se registraron impedimentos bloqueantes durante el Sprint 4. Sí se identificaron incidencias técnicas menores vinculadas a integración backend/frontend/blockchain, visualización en modo oscuro, direcciones wallet inválidas en datos de prueba, feedback de transacciones on-chain y ajustes de presentación para la demo.	Flujo operativo central del MVP ampliado con registro de ingresos de material reciclable, cálculo de puntos ECO mediante tabla de conversión, emisión de tokens, sincronización de eventos Minted, generación de comprobantes digitales, visualización de saldo e historial de aportes para empresas, exportación CSV,

SPRINT	GOAL	PUNTOS	HU	CAPACIDAD	DEFECTOS	PRUEBAS	IMPED.	INCREMENTO / OBSERVACIONES
							Todas fueron tratadas mediante Pull Requests correctivos o mejoras incrementales.	gestión administrativa de roles del contrato, pausa/despausa con motivo y quema de tokens mediante firma EIP-712. El Sprint 4 representó un salto de complejidad respecto de los sprints anteriores, ya que se integraron funcionalidades de frontend, backend, base de datos y contrato inteligente dentro del flujo operativo principal de EcoToken. El avance real fue más lento que el ideal durante las primeras semanas, pero el equipo logró completar las historias comprometidas hacia el cierre del sprint. También se realizaron ajustes complementarios y correcciones detectadas durante pruebas manuales y preparación de la demo.
Sprint 5 3 sem.	Cumplido	37/37	8/8	32/96 h	0 críticos 2 otros 2 incid. Sin evidencia	224 ✓ 0 ✕ 0 pend. Sin evidencia	0 No se registraron impedimentos bloqueantes durante el Sprint 5. Se presentaron conflictos de merge en archivos compartidos por ramas stackeadas y ajustes menores requeridos por CI, pero fueron resueltos sin impedir el cumplimiento del Sprint Goal.	Incremento funcional compuesto por el ranking mensual de empresas, incluyendo cálculo automático, endpoint de consulta, cierre mensual mediante snapshot auditable con hash SHA-256 y bloque de referencia, persistencia en PostgreSQL y visualización pública por período. Además, se amplió el registro y verificación de empresas, se realizó el rework del flujo de login y registro, se consolidó el panel de Empresa y se verificó el correcto funcionamiento de los paneles y restricciones de acceso para Cooperativa, Administrador y Municipalidad. Las 8 historias comprometidas fueron completadas y aceptadas, alcanzando 37 de 37 Story Points.

SPRINT	GOAL	PUNTOS	HU	CAPACIDAD	DEFECTOS	PRUEBAS	IMPED.	INCREMENTO / OBSERVACIONES
								E11-HU06 y E11-HU07 se cerraron mediante verificación explícita de sus criterios de aceptación sobre funcionalidades implementadas previamente, principalmente ProtectedRoute y los layouts/paneles por rol; no requirieron desarrollo funcional nuevo. No se realizaron cambios de smart contracts correspondientes a las 8 HUs oficiales del Sprint 5. Los desarrollos de la épica E8 realizados durante el mismo período se consideran trabajo anticipado de otro sprint y no forman parte de los 37 Story Points ni de las métricas de cumplimiento del Sprint 5. La capacidad real de 32 horas corresponde a una estimación retrospectiva, dado que no se utilizó una herramienta formal de registro horario.
